


Neubiberger Straße – Fernwärmeausführung in drei Abschnitten

Weiterbau Oedenstockacher Str. ortsauswärts

Parallel zu BA 2+3 und danach bis KW 28 (bis 11.07.) Sperrung Oedenstockacher Str. auswärts mit dem Ziel die Leitung soweit wie möglich zu bauen (bis 50m vor Neubau Schulgelände)

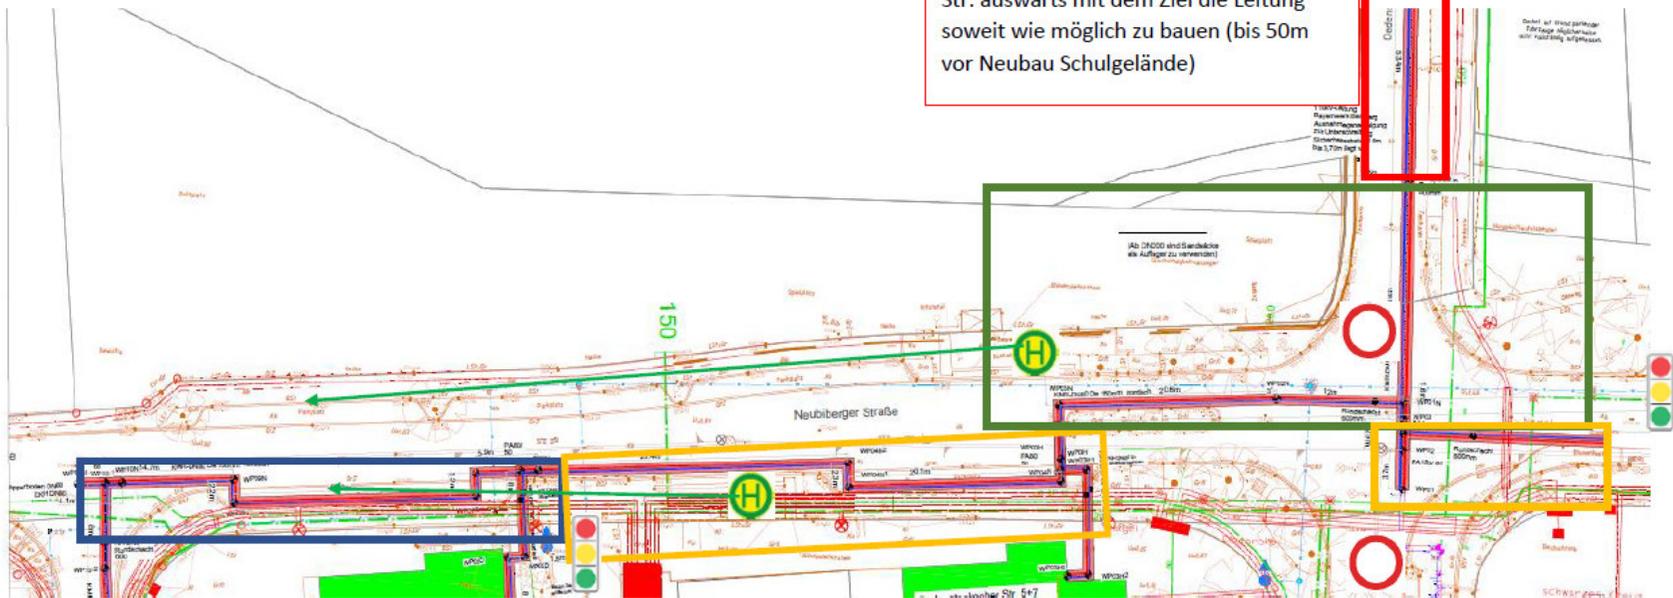

Abschnitt 1 (08.04. – 26.04.)	Abschnitt 2 (29.04. – 17.05.)	Abschnitt 3 (21.05. – 07.06.)
KW 15 Aufgraben KW 16 Rohrbau KW 17 Verfüllung + Asphaltierung	KW 18/19 Aufgraben KW 19/20 Rohrbau KW 20 Verfüllung + Asphaltierung	KW 21 Aufgraben KW 22 Rohrbau KW 23 Verfüllen und Asphaltieren
Halbseitige Sperrung (ohne Ampelregelung) Keine Beeinträchtigung Oedenstockacher Str.	Zweiphasige Ampelregelung, Neubiberger Str. einseitig befahrbar Oedenstockacher Str. auswärts/einwärts gesperrt	Zweiphasige Ampelregelung, Neubiberger Str. einseitig befahrbar (jetzt über andere Fahrspur) Oedenstockacher Str. auswärts/ einwärts gesperrt
Keine Beeinträchtigung der Bushaltestellen und Busverkehr TG-Zufahrt mit Stahlplatten abdecken, Parkbuchten gegenüber sperren.	Bushaltestellen sind nun zu versetzen, Änderung Fahrplan wegen Sperrung Oedenstockacher Str.	Bushalte stellen bleiben versetzt, ab KW 24 können Bushaltestellen wieder zurückgesetzt werden, Oedenstocker Str. ortsauswärts bleibt aber noch 5 Wochen gesperrt (bis KW 28)

Umleitungsplan Fernwärmeausbau der SWM in der Oedenstockacher Straße, 29.04. – 11.07.2024

